REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/05
URBROJ: 2140-01-22-04
Krapina, 11. ožujka 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 6. sjednici *održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donijela je*

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2021. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:
1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49216 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2021. godinu

U Pregradi, veljača 2022. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne Novine broj: 128/09, 142/14, 23/19, 83/21,) izvanproračunski korisnik Krapinsko-zagorske županije.

Županijska uprava za ceste je pravna osoba upisana u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Županijsku upravu za ceste zastupa i predstavlja Ravnatelj Stjepan Sirovec, mag.ing.traff. te njome rukovodi.

Unutarnjim ustrojem u Županijskoj upravi za ceste ustrojeni su:
- Ured ravnatelja i
- Organizacijske jedinice:

1. Odjel za obavljanje poslova održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
2. Odjel za obavljanje poslova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
3. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

U Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 8 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 5 djelatnika sa VSS, 2 djelatnika sa VŠS, 1 djelatnik sa SSS.

Županijskom upravom za ceste upravlja Upravno vijeće koje broji 5 članova.
U Upravno vijeće imenuju se predstavnici:
- Krapinsko-zagorske županije (četiri člana),
- radnika Županijske uprave za ceste (jedan član).

Četiri člana Upravnog vijeća – predstavnika Krapinsko-zagorske županije imenuje Županijska skupština, a jednog člana Upravnog vijeća – predstavnika radnika izabiru radnici u skladu sa Zakonom.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije od 07. listopada 2017.godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije članovi Upravnog vijeća do 06.listopada 2021. godine bili su imenovani kako slijedi: Nikola Boromisa, Tomislav Končevski, Josip Kovačić, Božo Ružak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Nikola Boromisa.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije od 07. listopada 2021.godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije članovi Upravnog vijeća do 06.listopada 2021. godine bili su imenovani kako slijedi: Nikola Boromisa, Žarko Miholić, Josip Kovačić, Davor Kljak. Po provedenim izborima između radnika, za predstavnika radnika izabrana je Ivana Palčec. Za predsjednika Upravnog vijeća izabran je Nikola Boromisa

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste obavlja slijedeće poslove: donosi Statut i druge opće akte; provodi natječajni postupak i predlaže Županijskoj skupštini kandidata za imenovanje ravnatelja; sklapa ugovor o radu s ravnateljem; donosi programe rada i razvoja; nadzire izvršavanje usvojenih programa i planova; donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine; predlaže osnivaču promjenu djelatnosti; daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Uprave za ceste; donosi odluke u drugom stupnju, u vezi predmeta kojima se odlučuje o pravima radnika; odlučuje o nabavi osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna, bez PDV; donosi i druge odluke, te obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu ili drugim aktima.

Temeljem članka 83. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. Pripreme izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

2. Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta:
- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
- pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
- pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju

kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
- ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju županijskih i lokalnih cesta te dijelova županijskih i lokalnih cesta i objekata na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima županijska i lokalna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

3. Održavanja županijskih i lokalnih cesta:

- planiranje održavanja i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s županijskih i lokalnih cesta,
- ophodnja.

4. Ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana.

5. Ostali poslovi utvrđeni Zakonom:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama.

U okviru javnih ovlaštenja Županijska uprava za ceste obavlja javnu ovlast kada izdaje akte iz članka 46. stavka 4., čanka 49. stavka 4., članka 51. stavka 3. i članka 52. stavka 1. Zakona.

Djelatnost iz st. 1. ovog članka ne obavlja se radi stjecanja dobiti, a možebitnu dobit Županijska uprava za ceste dužna je koristiti za građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), Ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:
423,997 km županijskih cesta
247,252 km lokalnih cesta
671,249 km UKUPNO

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati Županijska uprava za ceste u 2021. godini, postupano je po 1424 predmeta.

Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2021. godine provela:

- 7 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 36 postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI OSTVARENI U 2021. GODINI

U 2021. godini Županijska uprava za ceste ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.686.668,08 kn. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2021. godini, uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 50.290.406,65 kn što iznosi 5,48% više od planiranog za 2021. godinu. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 46.603.738,57 kn odnosno 97,75% planiranog za 2021. godinu. Višak prihoda uvrstiti će u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu na način da se iznos od 358.050,00 kn rezervira za neizvršene ugovore iz 2021. godine, a iznos od 3.328.618,08 kn rasporediti će se na nove radove sukladno I. izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

Tablica 1. Prihodi i primici ostvareni u 2021. godini

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Tekući plan 2021. (1)	Izvršenje 2021. (2)	Index (2/1)
6	Prihodi poslovanja	47.677.112,44	50.290.406,65	105,48%
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.139.077,46**	**4.292.092,46**	**136,73%**
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.139.077,46	4.292.092,46	136,73%
64	**Prihodi od imovine**	**38.595.500,00**	**40.048.029,67**	**103,76%**
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	24.446,75	95,87%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.570.000,00	40.023.582,92	103,77%
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po**	**40.000,00**	**46.859,11**	**117,15%**
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	46.859,11	117,15%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**16.500,00**	**16.396,00**	**99,37%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.500,00	16.396,00	99,37%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**192.000,00**	**192.994,43**	**100,52%**
683	Ostali prihodi	192.000,00	192.994,43	100,52%
92	**Rezultat poslovanja**	**5.694.034,98**	**5.694.034,98**	**100,00%**
922	Višak prihoda iz 2020. godine	5.694.034,98	5.694.034,98	100,00%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.292.092,46 kn odnosno 36,73% više od planiranog za 2021. godinu, a odnose se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:

- *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* koje su ostvarene od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini u iznosu od 1.154.178,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godine jer je Odluka donesena tek 16.11.2021. godine te će kao višak prihoda poslovanja iz izvora pomoći biti raspoređen u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu
- *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu od 2.837.914,46 kn ostvarene od Krapinsko - zagorske županije temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za pet klizišta na području Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 40.048.029,67 kn odnosno 3,76% više planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- ***Prihode od financijske imovine*** koji su ostvareni u iznosu od 24.446,75 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i prihodi od zateznih kamata. Prihod od zateznih kamata ostvaren je temeljem pravomoćnih sudskih Presuda u kojima je naloženo tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove, a samim time i zateznu kamatu od datuma pravomoćnosti presude do trenutka isplate troškova.

- ***Prihode od nefinancijske imovine*** koji su ostvareni su iznosu od 40.023.582,92 kn odnosno 3,77% više od planiranog, a odnose se na naknade za ceste.

Povećanje prihoda evidentirano je od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. U prvoj polovici 2021. godine, još uvijek zbog pandemije korona virusa, broj

registriranih vozila bio je tek u blagom rastu u odnosu na 2020. godine te je zbog toga planirani iznos naknade za ceste u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021.godinu bio planiran na razini ostvarenja 2020. godine. Promatrajući cijelu 2021. godinu registrirano je 68797 vozila, odnosno 2317 vozila više u odnosu na 2020. godinu te su tako i ostvareni veći prihodi u iznosu 1.454.285,12 kn u odnosu na planirano za 2021. godinu. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija i ostvarena je u iznosu od 1.069.554,15 kn, odnosno na razini planiranog.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 46.859,11 kn odnosno 17,15% više od planiranog, a čine ih prihodi po posebnim propisima odnosno naplate troškova postupka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, prihodi od Grada Zaboka temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševec Zabočki.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 16.396,00 kn odnosno 99,37% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na prihode za pruženu uslugu korištenja službenog vozila u privatne svrhe Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenju službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla). U ovoj vrsti prihoda ostvaruje se i prihod od troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe te ih nadoknađuju sami radnici.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 192.994,43 kn i to od nadoknade parničnih troškova po pravomoćnim sudskim presudama prema kojima su tužbeni zahtjevi u odnosu na Županijsku upravu za ceste odbijeni te je sud naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste nadoknade parnične troškove.

Višak prihoda odnosi se na višak ostvaren u 2020. godini u iznosu od 5.694.034,98 kn koji je u cijelosti uvršten u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu.

Tablica 2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2021. godini

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Tekući plan 2021. (1)	Izvršenje 2021. (2)	Index (2/1)
	RASHODI I IZDACI	47.677.112,44	46.603.738,57	97,75%
3	Rashodi poslovanja	40.682.112,44	39.617.566,25	97,38%
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.433.476,25**	**2.316.727,14**	95,20%
311	Plaće (Bruto)	1.908.476,25	1.860.913,62	97,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	118.248,00	76,29%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	337.565,52	91,23%
32	**Materijalni rashodi**	**33.946.862,44**	**33.350.067,53**	98,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	97.025,00	63,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	158.182,60	66,19%
323	Rashodi za usluge	33.269.362,38	32.838.068,13	98,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	256.791,80	90,26%
34	**Financijski rashodi**	**584.000,00**	**515.477,84**	88,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	369.220,26	99,79%
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	146.257,58	68,34%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.537.773,75**	**3.309.433,96**	93,55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.537.773,75	3.309.433,96	93,55%
38	**Ostali rashodi**	**180.000,00**	**125.859,78**	69,92%
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	125.859,78	69,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.995.000,00	4.986.615,48	99,83%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.990.000,00**	**4.986.615,48**	99,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.990.000,00	4.986.615,48	99,93%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.000.000,00**	**1.999.556,84**	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.316.727,14 kn odnosno 95,20 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:
311 Plaće (bruto) - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
312 Ostali rashodi za zaposlene - odnose se na isplatu materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije
313 Doprinosi na plaće - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 33.350.067,53 kn odnosno 98,24% godišnjeg plana za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:
321 Naknade troškova zaposlenima - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla te troškove seminara i usavršavanja zaposlenika. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu od planiranog zbog manjeg broja službenih putovanja, organiziranog rada od kuće kada se nije isplaćivao prijevoz na posao i s posla i minimalnog sudjelovanja radnika na stručnim usavršavanja, a sve sukladno preporukama i odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
322 Rashodi za materijal i energiju - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.
323 Rashodi za usluge - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m^2 posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 515.477,84 kn odnosno 88,27 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:
342 Kamate za primljene kredite i zajmove - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
343 Ostali financijski rashodi - odnose se na tekuću pričuvu, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i vlasnicima odjavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 3.309.433,96 kn odnosno 93,55% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:
- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.633.982,77 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za održavanje nerazvrstanih cesta. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Tijelom 2021. godine sklopljeno je pet Sporazuma za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Neizvršeni iznos radova po sklopljenim Sporazumima sa 31.12.2021. godine je 198.975,00 kn. Navedeni radovi planiraju se završiti do 30.06.2022. godine te će potrebna sredstva za isplatu po Sporazumu biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 125.859,78 kn odnosno 69,92% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na naknadu štete fizičkoj osobi sukladno presudi Županijskog suda u Zagrebu Poslovni broj 8 Gž-2133/2020-3 (nalet divljači u mjestu Hruševec, 2015. godine). U ovoj podskupini evidentiran je i rashod za isplatu naknade štete bivšem radniku sukladno presudi Općinskog suda u Zlataru, posl. br.: Pr-47/2018-12.

- **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni. Temeljem članka 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) donijeta je odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti kojom se nefinancijska imovine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu razvrstava u sitni inventar te se izvršenje za navedene rashode iskazuju u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 4.986.615,48 kn odnosno 99,93% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem odluke Hrvatskih voda. Po provedenim postupcima nabave tijekom 2021. godine ugovoreni su radovi za sanaciju pet klizišta na županijskim cestama. Svi radovi su završeni u 2021. godini.

- **IZDAĆI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.999.556,84 kn.

3. Prikaz radova građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi građenja i održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	29.309.077,40 kn	29.375.602,45 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu 29.309.077,40 kn, a realizirani su u ukupnoj vrijednosti 29.375.602,45 kn. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kojim su obuhvaćeni radovi ljetnog i zimskog održavanja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine - planirani su u ukupnom iznosu 17.570.577,40 kn, a izvedeni u vrijednosti 17.567.902,17 kn. Predmetni radovi su realizirani temeljem tri ugovora sklopljena temeljem okvirnog sporazuma. Prvi ugovor realiziran je u razdoblju od 01.01.2021. do 31.10.2021. godine u ukupnom iznosu 14.997.346,61 kn, drugi ugovor u razdoblju od 01.11.2021. do 30.11.2021. godine u iznosu 979.770,80 kn, te treći ugovor realiziran je u razdoblju od 01.12.2021. godine do 31.12.2021. godine u iznosu 1.590.784,76 kn.
U tabličnom obliku prikazane su ukupne vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova redovitog održavanja, odnosno u kojem su obimu pojedini radovi zastupljeni.

IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2021.-31.12.2021. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Ukupno	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	189.707,42 kn	1,35%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	88.523,96 kn	0,63%
3.	ASFALTNI KOLNIĆI	1.861.387,22 kn	13,24%
4.	BANKINE	469.555,83 kn	3,34%
5.	POKOSI	59.275,15 kn	0,42%
6.	ODVODNJA	1.801.068,44 kn	12,82%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	1.841.968,95 kn	13,11%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	1.954.845,77 kn	13,91%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	4.673,68 kn	0,03%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	61.442,41 kn	0,44%
12.	INTERVENTNI RADOVI	230.486,10 kn	1,64%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	5.491.386,81 kn	39,07%
	UKUPNO:	14.054.321,74 kn	100%
	PDV 25%	3.513.580,43 kn	
	SVEUKUPNO:	17.567.902,17 kn	

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KZŽ za vrijeme zimske službe planiran je u iznosu 1.100.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 1.206.325,27 kn odnosno 2.064,76 tona. Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave.
Također je uz utrošen natrijev klorid, utrošeno je 4.282,65 m3 posipnog materijala (kamene sitneži), ukupne vrijednosti 566.123,50 kn bez PDV-a obračunate u stavci 13. prije navedene tablice izvedenih radova redovitog održavanja.

Tablica 2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
13.14.3.	Natrijev klorid evidencijski - 2.064,76 t	1.206.325,27 kn

1.3. Radovi na sanaciji propusta/mostova prikazani u tablici 3., obuhvaćaju radove na sanaciji propusta na lokalnoj cesti L22080 u mjestu Vilanci ukupne vrijednosti izvedenih radova 599.001,23 kn, radove na sanaciji propusta na županijskoj cesti Ž2204 u mjestu Sušobreg ukupne vrijednosti izvedenih radova 606.128,46 kn, radove na sanaciji mosta na županijskoj cesti Ž2170 u mjestu Gornja Batina ukupne vrijednosti izvedenih radova 1.003.976,74 kn te radove na sanaciji propusta na županijskoj cesti Ž2165 u mjestu Bedekovčina ukupne vrijednosti izvedenih radova 634.242,19 kn

Tablica 3. Radovi na sanaciji propusta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.3.1.	22080	IV	Vilanci	Radovi na sanaciji propusta	600.000,00 kn	599.001,23 kn
1.3.2.	2204	III	Sušobreg	Radovi na sanaciji propusta	607.000,00 kn	606.128,46 kn
1.3.3.	2170	IV	Gornja Batina	Radovi na sanaciji mosta	1.004.000,00 kn	1.003.976,74 kn
1.3.4.	2165	IV	Bedekovčina	Radovi na sanaciji propusta	635.000,00 kn	634.242,19 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	**2.846.000,00 kn**	**2.843.348,63 kn**

1.4. Radovi na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 6.700.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 6.673.969,55 kn.
Programom sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama planirana je sanacija 19 dionica na županijskim i lokalnim cestama. Radovi na dionicama Ž2128 Markuš Brijeg I Ž2198 Bedekovčina nisu realizirani radi predviđenih radova na izgradnji kolektora aglomeracije, dok su radovi na Ž2197 Andraševec ŽCP izvedeni u manjem obimu odnosno u zoni ŽCP-a također radi predviđenih i radova u tijeku na izgradnji kolektora aglomeracije na preostalom dijelu dionice. Radovima na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva ukupno je ugrađeno 71.529,99 m2 završnog sloja asfalta.

Tablica 4. Sanacija habajućih asfaltnih slojeva na ŽC I LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.4.1.	2093	IV	Poredje-Grletinec	Sanacija habajućih slojeva	6.700.000,00 kn	464.911,21 kn
	2117	IV	Sopot			467.223,84 kn
	2120	IV	Štuparje			374.232,84 kn
	2127	IV	Veternica			144.851,95 kn
	2128	IV	Markuš Brijeg			0,00 kn
	2168	IV	Bukovec			330.036,35 kn
	2169	IV	Donja Selnica - Budinšćina			500.183,68 kn
	2169	IV	Završje Belečko			571.114,10 kn
	2170	IV	Bočadir			492.518,09 kn
	2197	IV	Andraševec ŽCP			94.562,36 kn
	2198	IV	Bedekovčina - D14			0,00 kn
	2215	III	Radakovo			523.262,12 kn
	22010	IV	Ravninsko			560.607,01 kn
	22004	IV	Luka Poljanska			413.645,44 kn
	22038	IV	Mrzlo Polje			374.758,08 kn
	22047	IV	Kozjak Začretski			410.830,02 kn
	22060	IV	Husinec			187.680,50 kn
	22078	IV	Selnica			362.293,76 kn
	22089	IV	Gornja Šemnica			401.258,21 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	6.700.000,00 kn	6.673.969,55 kn

1.5. Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih slojeva ŽC i LC navedeni u tablici 5., planirani su u ukupnom iznosu od 45.000,00 kn, a realizirani u ukupnom iznosu 44.625,00 kn. Uslugom tehnološkog nadzora nad izvođenje radova sanacije habajućih slojeva osigurava se tražena kvaliteta ugrađenog asfalta na županijskih i lokalnih cesta. Ukupno je izvedeno 66 zasebnih kontrolnih ispitivanja izvedenog sloja uzimanjem uzoraka bušenjem čime je utvrđen stupanj zbijenosti, udio šupljina, debljina izvedenog sloja i povezanost slojeva, a sve na uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 izvedenog asfaltnog sloja. Također izvedena su kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mješavine.

Tablica 5. Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih slojeva ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.5.1.	više ŽC i LC	III i IV	Više dionica	Nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	45.000,00 kn	44.625,00 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	45.000,00 kn	44.625,00 kn

1.6.a Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 6.a., planirani su ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 43,224,18 kn.
Ova sredstva utrošena su za podmirenje troškova usluga iskolćenja instalacija od strane ovlaštenih javnopravnih tijela na više lokacija za potrebe izvođenja radova održavanja javnih cesta.

Tablica 6.a Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.6.1.a	Više ŽC i LC	III i IV	Područje KZŽ	Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)	50.000,00 kn	43.224,18 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	50.000,00 kn	43.224,18 kn

1.6.b Radovi na sanaciji opasnih mjesta na ŽC i LC navedeni u tablici 6.b, planirani su ukupnom iznosu od 450.900,00 kn, a realizirani u iznosu od 450.556,85 kn.
Ovim programom sanirano je ukupno pet opasnih mjesta ugradnjom asfaltbetona za vrlo tanke slojeve - BBTM 11B 45/80-65 AG2 M2 specificiran prema normi HRN EN 13108-2, za završni sloj debljine 30 mm, čime se osigurava maksimalna hrapavost završnog sloja asfalta. Ukupno je ugrađeno 5.971,10 m2 BBTM-a, odnosno sanirano je ukupno 974,30 m prometnica.

Tablica 6.b Radovi na sanaciji opasnih mjesta na ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.6.1.b	2164	III	Mali Bukovac	Sanacija opasnog mjesta ugradnjom BBTM asfalta	450.900,00 kn	120.117,85 kn
	2219	III	Strmec Stubički			106.614,01 kn
	2224	III	Gornja Stubica			100.410,34 kn
	2195	III	Zabok			58.258,01 kn
	2217	III	Krušljevo Selo			65.156,64 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	450.900,00 kn	450.556,85 kn

1.6. Kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 6.c., planirani su ukupnom iznosu od 546.600,00 kn, a realizirani u iznosu od 545.650,80 kn.
Ovim radovima izvršena je ugradnja cestovnih rubnjaka za vođenje površinskih oborinskih voda na kolnicima županijskih i lokalnih cesta, na taj način sanirano je deset zasebnih lokacija na sljedećim županijskim cestama Ž2096, Ž2119, Ž2123, Ž2131, Ž2155, Ž2166, Ž2198 i Ž2219 te na lokalnoj cesti L22030. Navedenim zahvatom ugrađeno je ukupno 1424 m cestovnih rubnjaka, uz izradu dodatnih slivnika te su mjestimično ugrađene PP/PE korugirne cijevi promjera DN 200 i DN 400 mm.

Tablica 6.c Kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.6.1.c	2096, 2119, 2123, 2131, 2155, 2166, 2198, 2219, 22030	III/IV	Više ŽC i LC	Kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka	546.600,00 kn	545.650,80 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	546.600,00 kn	545.650,80 kn

2.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - RADOVI NA KAPITALNIM PROJEKTIMA - SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00 kn	5.227.971,73 kn

2.1. Radovi na sanaciji klizišta navedeni u tablici 7., planirani su ukupnom iznosu od 4.963.000,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.986.615,48 kn. Radovi su uspješno realizirani.
Programom sanacije klizišta izvršena je sanacija pet klizišta na županijskim cestama. Radovi su sufinancirani od strane Hrvatskih Voda temeljem Plana upravljanja vodama za 2021. godinu i Odluke o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2021. godinu, a iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Sufinanciranje je izvršeno u omjeru 55% Hrvatske vode, 45% ŽUC, odnosno iznos sufinanciranja od strane Hrvatskih voda iznosi ukupno 2.837.914,46 kn.

Tablica 7. Radovi na sanaciji klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
2.1.1.	2204	IV	Poljanica Bistrička	Radovi na sanaciji klizišta	795.000,00 kn	794.785,34 kn
2.1.2.	2155	III	Klokovec	Radovi na sanaciji klizišta	2.163.000,00 kn	2.161.055,50 kn
2.1.3.	2200	IV	Hruševec	Radovi na sanaciji klizišta	562.000,00 kn	561.711,89 kn
2.1.4.	2153	IV	Razdrto Tuheljsko	Radovi na sanaciji klizišta	865.000,00 kn	891.394,25 kn
2.1.5.	2118	III	Gorjakovo	Radovi na sanaciji klizišta i pokosa	578.000,00 kn	577.668,50 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	4.963.000,00 kn	4.986.615,48 kn

2.2. Usluga stručnog, tehnološkog i geodetskog nadzora navedenih u tablici 8., planirana su u ukupnom iznosu od 242.000,00 kn te su realizirani u ukupnom iznosu 241.356,25 kn. Usluge vanjskog stručnog nadzora ugovorene su za praćenje radova sanacije klizišta sufinanciranih od strane Hrvatskih voda. Stručni nadzor nad radovima sanacije klizišta i pokosa uz županijsku cestu Ž2118 u mjestu Gorjakovo izvršeni su od strane djelatnika Uprave i Hrvatskih voda.

Tablica 8. Stručni, tehnološki i geodetski nadzor na projektima - sanacija klizišta

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
2.2.1.	2204	IV	Poljanica Bistrička	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	39.750,00 kn	39.750,00 kn
2.2.2.	2155	III	Klokovec	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	124.450,00 kn	124.450,00 kn
2.2.3.	2200	IV	Hruševec	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	34.980,00 kn	34.968,75 kn
2.2.4.	2153	IV	Razdrto Tuheljsko	Nadzor nad radovima sanacije klizišta	42.820,00 kn	42.187,50 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	242.000,00 kn	241.356,25 kn

b) Izvedeni radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

3.	PLANIRANI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	870.000,00 kn	684.545,00 kn

3.1. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja planirano je u vrijednosti od 870.000,00 kn, a realizirano u vrijednosti 684.545,00 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama, te dokumentacija za radove na sanaciji i rekonstrukciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta, te postupci evidentiranja stvarnog stanja javnih cesta.

Ukupno je ugovorena izrada 12 zasebnih projekata.

U cilju sređivanja zemljišno knjižnog statusa javnih cesta iz nadležnosti kontinuirano se provodi program evidentiranja stvarnog stanja županijskih i lokalnih cesta, te je u 2021. godini uspješno evidentirano ukupno 18,42 km javnih cesta.

Ugovoreni projekti koji nisu završeni u 2021. godini zbog ugovoranja u drugoj polovici kalendarske godine završiti će se početkom 2022. godine, a vrijednosti ugovorenih projekata su: projekt sanacije klizišta Putkovec na Ž2096 u iznosu 59.950,00 kn, projekt sanacije klizišta Stubičke Toplice na Ž2217 u iznosu 31.000,00 kn te projekt novelacije projektne dokumentacije i projektiranje raskrižja s kružnim tokom prometa u mjestu Krapinske Toplice u iznosu 68.125,00 kn.

Tablica 9. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta ugovorenog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
3.1.1.	22053, 22036, 2118, 2161, 2162, 2200, 2221	III/IV	Više dionica	Snimak stvarnog stanja	227.950,00 kn	226.870,00 kn
3.1.2.	2153	IV	Tuheljsko Razdrto	Novelacija projekta sanacije klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
3.1.3.	22078	IV	Selnica	Projekt rekonstrukcije mosta i prometnice	95.000,00 kn	95.000,00 kn
3.1.4.	2201	IV	Dubovec - Banšćica	Projekt rekonstrucije prometnice	50.000,00 kn	48.250,00 kn
3.1.5.	2151	III	Vrhi Vinagorski	Projekt sanacije klizišta	85.000,00 kn	85.000,00 kn
3.1.6.	2096	III	Putkovec	Projekt sanacije klizišta	60.000,00 kn	0,00 kn
3.1.8.	22029	IV	Dugnjevec	Projekt sanacije klizišta	37.300,00 kn	36.300,00 kn
3.1.9.	2204	III	Poljanica Bistrička	Novelacija projekta sanacije klizišta	49.750,00 kn	43.500,00 kn
3.1.10.	22027	III	Donji Škrnik	Projekt sanacije klizišta	65.000,00 kn	64.625,00 kn
3.1.11.	2118	III	Gorjakovo	Projekt sanacije klizišta i pokosa vodotoka	40.000,00 kn	40.000,00 kn
3.1.12.	2217	III	Stubičke Toplice	Projekt sanacije klizišta	40.000,00 kn	0,00 kn
3.1.13.	2155	III	Krapinske Toplice	Novelacija projektne dokumentacije i raskrižje s kružnim tokom prometa	75.000,00 kn	0,00 kn
					870.000,00 kn	684.545,00 kn

4.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.750.000,00 kn	1.633.982,77 kn

4.1. Županijskoj upravi za ceste KZŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21). Tijekom 2021. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.633.982,77 kn.

5.	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.800.000,00 kn	1.619.201,19 kn

5.1. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice planirano je u vrijednosti od 1.800.000,00 kn, a realizirano u vrijednosti 1.619.201,19 kn. Tijekom 2021. godine ova Uprava za ceste sufinacirala je pet zasebna zahvata kojima su nositelji bili jedinice lokalne samuprave. Radovi od strane grada Pregrade su ugovoreni tijekom 12 mj. 2021. godine te će se realizirati početkom 2022. godine.

Tablica 13. Sufinanciranje radova rekonstrukcije i proširenja prometnice

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice /JLS	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
5.1.1.	2189	III	Martinišće/Grad Zabok	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje	350.000,00 kn	349.820,00 kn
	2186	III	Novi Dvori Klanječki/ Grad Klanjec	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje	450.000,00 kn	449.753,13 kn
	2196	III	Varaždinska ulica/ Grad Zlatar	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje	450.000,00 kn	449.725,75 kn
	2096	III	Gorička ulica/ Grad Pregrada	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje	180.000,00 kn	- kn
	22076	IV	Gornja Podgora/ Grad Donja Stubica	Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje	370.000,00 kn	369.902,31 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	1.800.000,00 kn	1.619.201,19 kn

6.	NEIZVRŠENI RADOVI I USLUGE TEMELJM UGOVORA IZ 2020. GODINE	975.085,25 kn	975.047,63 kn

6.1. Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2021. godine prikazani su u niže navedenoj tablici 11.
Radovi koji nisu završeni tijekom 2020. godine uspješno su realizirani tijekom 2021. godine.

Tablica 11. Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2020. godine

Red. br.	Br. ceste	Kategorija ceste	Naziv dionice / naziv objekta / naziv klizišta	Vrsta usluge	III. IZMJENA PLANA RADOVA	IZVRŠENJE
6.1.1.	2125	III	Mače	Projekt sanacije propusta	18.000,00 kn	18.000,00 kn
6.1.2.	2165	IV	Bedekovčina	Projekt rekonstrukcije ceste	111.250,00 kn	111.250,00 kn
6.1.3.	2155	III	Krapinske Toplice - Klokovec	Izmjena i dopuna projekta sanacije klizišta	69.375,00 kn	69.375,00 kn
6.1.4.	2168	III	Mali Bukovac	Projekt rekonstrukcije prometnice	79.375,00 kn	79.375,00 kn
6.1.5.	22036	IV	Dubrovčan	Projekt rekonstrukcije prometnice	31.750,00 kn	31.750,00 kn
6.1.6.	22053	IV	Lovrečan	Projekt rekonstrukcije prometnice i propusta	64.375,00 kn	64.375,00 kn
6.1.7.	2248	III	Šimunci	Projekt sanacije mosta	19.375,00 kn	19.375,00 kn
6.1.8.	2151	III	Pregrada/Sopot	Izgradnja nogostupa i autobusnog stajališta	56.250,00 kn	56.250,00 kn
6.1.9.	22096	III	Štuparje	Radovi na sanaciji propusta	525.335,25 kn	525.297,63 kn
				UKUPNE VRIJEDNOSTI:	975.085,25 kn	975.047,63 kn

REKAPITULACIJA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Redni broj	Opis radova	PLAN RADOVA 2021. GODINE	IZVRŠENJE
1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	29.309.077,40 kn	29.375.602,45 kn
2.	Planirana dodatna ulaganja na građevinskim objektima - radovi na kapitalnim projektima - sanacija klizišta	5.205.000,00 kn	5.227.971,73 kn
3.	Planirani radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	870.000,00 kn	684.545,00 kn
4.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	1.750.000,00 kn	1.633.982,77 kn
5.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	1.800.000,00 kn	1.619.201,19 kn
6.	Neizvršeni radovi i usluge temeljem ugovora iz 2020. godine	975.085,25 kn	975.047,63 kn
	UKUPNO PLANIRANI I IZVRŠENI RADOVI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU	**39.909.162,65 kn**	**39.516.350,77 kn**

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

KLASA: 001-02/22-01/02
URBROJ: 2140-35-03/1-22-1
Pregrada: 25.02.2022.

PRILOG 1

PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,101	6,270	18,371
GRAD KLANJEC	10,286	9,229	19,515
GRAD OROSLAVJE	*11,064*	5,779	16,843
GRAD PREGRADA	31,156	6,845	38,001
GRAD ZABOK	*25,867*	4,364	30,231
GRAD ZLATAR	24,966	17,511	42,477
OPĆINA BEDEKOVČINA	38,128	2,310	40,438
OPĆINA BUDINŠČINA	10,603	7,258	17,861
OPĆINA DESINIĆ	21,360	8,480	29,840
OPĆINA ĐURMANEC	6,612	11,215	17,827
OPĆINA GORNJA STUBICA	20,709	6,448	27,157
OPĆINA HRAŠĆINA	9,276	11,060	20,336
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,637	*8,192*	16,829
OPĆINA JESENJE	0,000	5,724	5,724
OPĆINA KONJŠČINA	7,882	20,166	28,048
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,992	6,891	21,883
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,788	19,280	34,068
OPĆINA KUMROVEC	6,549	5,768	12,317
OPĆINA LOBOR	9,954	8,312	18,266
OPĆINA MAČE	8,457	2,227	10,684
OPĆINA MARIJA BISTRICA	17,963	8,236	26,199
OPĆINA MIHOVLJAN	11,625	0,863	12,488
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,736	3,027	7,763
OPĆINA PETROVSKO	6,810	1,632	8,442
OPĆINA RADOBOJ	14,070	9,240	23,310
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	18,319	0,000	18,319
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	24,215	2,297	26,512
OPĆINA TUHELJ	9,726	6,979	16,705
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE	18,575	25,121	43,696
OPĆINA ZAGORSKA SELA	1,826	6,204	8,030
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	2,745	10,324	13,069
Ukupno km	**423,997**	**247,252**	**671,249**

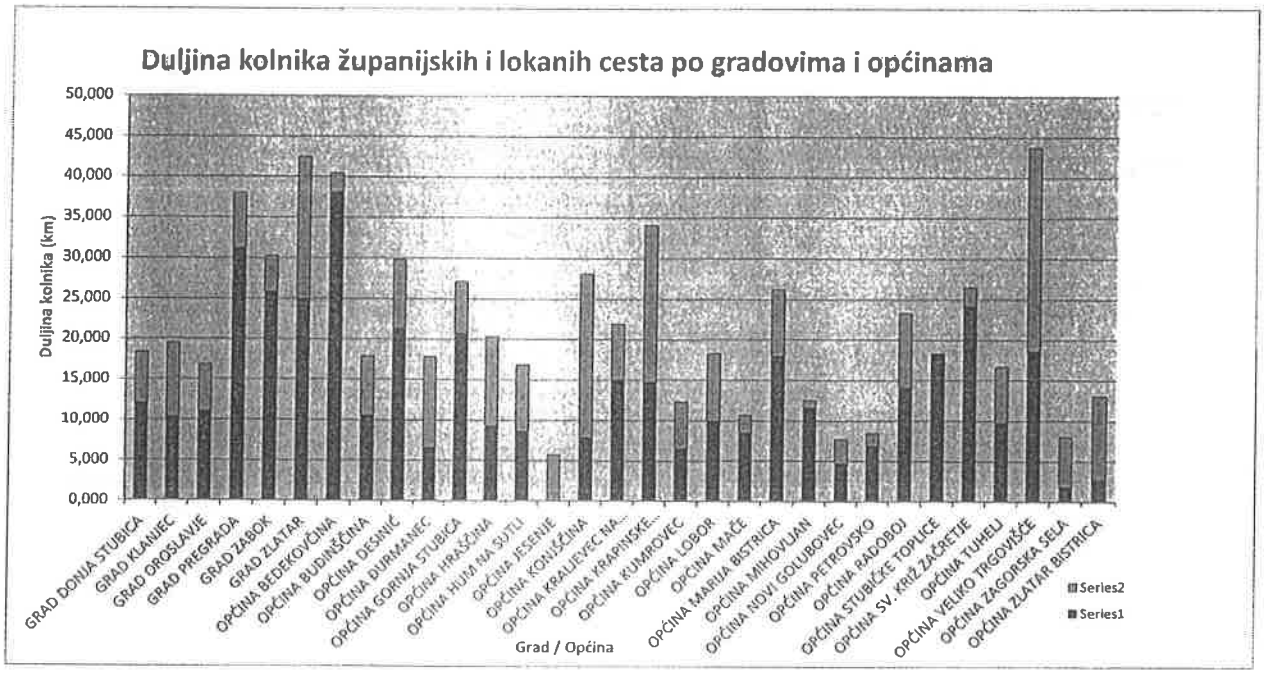
Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama
Duljina kolnika (km)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
GRAD DONJA STUBICA
GRAD KLANJEC
GRAD OROSLAVJE
GRAD PREGRADA
GRAD ZABOK
GRAD ZLATAR
OPĆINA BEDEKOVČINA
OPĆINA BUDINŠĆINA
OPĆINA DESINIĆ
OPĆINA DURMANEC
OPĆINA GORNJA STUBICA
OPĆINA HRAŠĆINA
OPĆINA HUM NA SUTLI
OPĆINA JESENJE
OPĆINA KONIŠĆINA
OPĆINA KRAJEVEC NA...
OPĆINA KRAPINSKE...
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINA LOBOR
OPĆINA MAČE
OPĆINA MARIJA BISTRICA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC
OPĆINA PETROVSKO
OPĆINA RADOBOJ
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINA TUHELJ
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
OPĆINA ZAGORSKA SELA
OPĆINA ZLATAR BISTRICA
Grad / Općina
Series2
Series1

Prilog 2
